

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Oprava chodníku v obci Třebnouševs“

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Obec Třebnouševs
IČ: 00272221
DIČ: CZ 00272221
Sídlo: Třebnouševs 80, 508 01 Hořice
Zastoupený: starostou panem Pavlem Zajícem

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: IZOTRADE s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
Zastoupený / jednatel: Jiří Skala, jednatel společnosti
IČ: 283 68 509
DIČ: CZ 283 68 509
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Nový Bydžov
číslo účtu: 220889614/0300

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: „**Oprava chodníku v obci Třebnouševs**“ tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele – které jsou přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.

4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
7. Místem plnění díla je chodník na návsi v obci Třebnouševěs.
8. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: září, říjen 2015 dle dohody s objednatelem.
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 31. prosince 2015, doba realizace max. 90 dní.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotýčná situace pominula.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smlouvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, tuto dokumentaci a podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální s DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

814 181,71,- Kč

(slovy: osm set čtrnáct tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých sedmdesát jeden haléřů)

3. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku ÚRS 2015.

5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jenž bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury), kterým bude cena díla vyúčtována. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
3. Daňový doklad – faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty platného ke dni zdanitelného plnění.
4. Splatnost daňového dokladu je **25 dnů** ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
5. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodlouží, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu listopadu nebo prosince 2015 po podpisu této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Vykližené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla.

8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení tyto doklady:
 - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
 - **Fotodokumentaci z průběhu výstavby.**
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel.
2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamací objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **500,- Kč** a to za každý den prodlení.

2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec, v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:
 - a. za objednatele: Pavel Zajíc, tel.: 724 386 808
 - b. za zhotovitele: Miroslav Drozen, tel.: 775 590 703
2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí.
3. Dodavatel stavby zajistí stanovení dopravního značení odsouhlasené DI Policie ČR.
4. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (subdodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
6. V případě, že zhotovitel nezhájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s

reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
 - b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
 - c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů
 - d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
 - a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
 - b. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
 - c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné;
 - d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté, co nastala.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

15. Závěrečné ustanovení

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.
2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:


- a. **Příloha č. 1** – Cenová nabídka zhotovitele
- b. **Příloha č. 2** – Výzva objednatele
- c. **Příloha č. 3** – Harmonogram postupu výstavby

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Třebnouševsi dne 10.9.2015

Ve Sběři dne 24.07.2015

za objednatele


.....
OBEC TŘEBNOUŠEVES
508 01 Hořice

za zhotovitele


.....
DOPRAVNÍ STAVBY
70 Křenovská 1337
102 60 Praha 6
IČ - 28369509 DIČ - CZ28369509
Jiří Skala
Jednatel společnosti

Zadání s výkazem výměr

Stavba : Oprava chodníků

Objekt :

JKSO :

Zpracoval : Mistr

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	324,010	35,00	11 340,35
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"od hospody"

(18+20,8+17,3+12,3+9,4) *1,6

124,480

(28,6+3,9+21+6+19) *1,6

125,600

"před OÚ" 6*7,9/2 +2

25,700

8,1*1,3

10,530

5*1,3

6,500

Mezisoučet

292,810

" chodník k čekárně" 8*0,9

7,200

"před čp.30" 9*1,6

14,400

"před čp.65-část" 6*1,6

9,600

Mezisoučet

31,200

Součet

324,010

2	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm vjezdy	m2	74,240	446,00	33 111,04
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"vjezdy od čp 58 OÚ"

(5+16+4+9 +7 +6+6+4,9+8)*1,6

105,440

Mezisoučet

105,440

"plochy pro vjezdy dlažděné"

" chodník k čekárně" - 8*0,9

-7,200

"před čp.30" - 9*1,6

-14,400

"před čp.65-část"- 6*1,6

-9,600

Mezisoučet

-31,200

Součet

74,240

3	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm vjezdy -prodloužení	m2	91,900	446,00	40 987,40
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"prodloužení vjezdu"

"vjezd č.5" 7* (5,1-1,6)

24,500

"č.4" 6*(5,3-1,6)

22,200

"č.3" 6*(5,4-1,6)

22,800

" č. 1" 8*(4,4-1,6)

22,400

Mezisoučet

91,900

4	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	240,300	42,00	10 092,60
---	-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

"od čp 58 -OÚ"

(19+6+21+3,9+28,6+9,4+12,3+17,3+20,8+18)

156,300

"před OÚ" 10

10,000

8,1

8,100

Mezisoučet

174,400

"vjezdy od čp 58 OÚ"

(5+16+4+9 +7 +6+6+ 4,9+8)

65,900

Mezisoučet

65,900

Součet

240,300

5	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 - chodníka a vjezdy	m3	99,563	108,00	10 752,80
"chodník" 324,01 * 0,25					81,003		
"vjezdy" 74,24 * 0,25					18,560		
Součet					99,563		

6	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem - z prodloužených vjezdů	m3	22,975	108,00	2 481,30
"prodloužení vjezdu"							
"vjezd č.5" 7* (5,1-1,6)					24,500		
"č.4" 6*(5,3-1,6)					22,200		
"č.3" 6*(5,4-1,6)					22,800		
" č. 1" 8*(4,4-1,6)					22,400		
Mezisoučet					91,900		
91,9 * 0,25					22,975		

7	001	1621	Poplatky za skládku - odkopávky z chodníků a vjezdů	m3	99,560	270,00	26 881,20
8	001	1621	Poplatky za skládku - odkopávky z prodloužených vjezdů	m3	22,560	270,00	6 091,20
9	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	99,563	76,00	7 566,79
10	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - prodlouž. vjezdy	m3	22,975	76,00	1 746,10

1 Zemní práce

151 050,78

5 Komunikace

11	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - chodníky	m2	292,810	57,00	16 690,17
"chodníky" 292,81					292,810		

12	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - vjezdy	m2	74,240	57,00	4 231,68
13	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - prodloužené vjezdy	m2	91,900	57,00	5 238,30
14	221	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm - chodníky	m2	292,810	143,00	41 871,83
15	221	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm - vjezdy	m2	74,240	143,00	10 616,32
16	221	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm - prodloužené vjezdy	m2	91,900	143,00	13 141,70
17	221	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm prodloužené vjezdy	m2	91,900	158,00	14 520,20

"prodloužení vjezdu"
"vjezd č.5" 7* (5,1-1,6) 24,500
"č.4" 6*(5,3-1,6) 22,200
"č.3" 6*(5,4-1,6) 22,800
" č. 1" 8*(4,4-1,6) 22,400
Mezisoučet 91,900

18	MAT	592453080	dlažba kostková BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	94,657	145,00	13 725,27
91,9*1,03					94,657		

19	221	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm - vjezdy	m2	105,440	158,00	16 659,52
"vjezdy od čp 58 OÚ"							
(5+16+4+9 +7 +6+6+4,9+8)*1,6					105,440		

20	MAT	592453080	dlažba kostková BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	108,603	145,00	15 747,44
105,44 *1,03					108,603		

21	221	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl nad 300 m2	m2	292,810	158,00	46 263,98
"chodníky" 292,81					292,810		
Součet					292,810		

22	MAT	592453080	dlažba kostková BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	301,594	145,00	43 731,13
			292,81*1,03		301,594		
5			Komunikace				242 437,53
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
23	011	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi - vjezdy	t	0,323	25 000,00	8 075,00
			"oka 100/100/6"				
			64,64 * 0,005		0,323		
24	014	631312141	Přibetonování obrubníku betonem prostým, dobetonování	m3	5,272	1 795,00	9 463,24
			"v komunikaci"				
			234,3*0,15*0,15		5,272		
25	011	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi - prodloužené vjezdy	t	0,346	25 000,00	8 650,00
			"oka 100/100/6"				
			69,1*0,005		0,346		
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení				26 188,24
8			Trubní vedení				
26	271	871	Napojení kanalizace před čp.30	s	1,000	3 500,00	3 500,00
27	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	6,000	1 100,00	6 600,00
28	MAT	553402750	poklopy ocelové, OP 6 600 x 600 mm - těžký	kus	6,000	5 250,00	31 500,00
29	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením a podbetonováním	kus	6,000	1 250,00	7 500,00
8			Trubní vedení				49 100,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
30	221	916561111	Osazení záhon. obrub. beton. do lože z betonu s boč. opěr. -prodl.vjezdy	m	27,600	159,00	4 388,40
			"prodloužení vjezdu"				
			"vjezd č.5" (5,1-1,6) * 2		7,000		
			"č.4" (5,3-1,6) *2		7,400		
			"č.3" (5,4-1,6) * 2		7,600		
			"č.1" (4,4-1,6) *2		5,600		
			Součet		27,600		
31	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	28,428	53,00	1 506,68
			27,6 *1,03		28,428		
32	221	916561111	Osazení záhon. obrub. beton. do lože z betonu s boč. opěr.	m	48,800	159,00	7 759,20
			"od hospody"				
			18+20,8 +10		48,800		
33	MAT	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	50,264	53,00	2 663,99
			48,8*1,03		50,264		
34	221	917732111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	95,840	195,00	18 688,80
			"vjezdy od čp 58 OÚ"				
			(5+16+4+9 +7 +6+4,9+8) *1,6		95,840		
			Mezisoučet		95,840		
			Součet		95,840		
35	221	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	174,400	195,00	34 008,00
			"od.čp 58 -OÚ"				
			(19+6+21+3,9+28,6+9,4+12,3+17,3+20,8+18)		156,300		

"před OÚ" 10

10,000

8,1

8,100

Mezisoučet

174,400

36	MAT	592175040	obrubník přírodní 100x15/12x25 cm	kus	278,347	98,00	27 278,01
----	-----	-----------	-----------------------------------	-----	---------	-------	-----------

(95,84+174,4)*1,03

278,347

37	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	278,000	95,00	26 410,00
38	013	97801	Poplatky za skládku - suti (beton,dlažba,obrubníky"	t	116,930	155,00	18 124,15
39	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	116,938	53,00	6 197,73
40	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	719,520	12,00	8 634,24

119,92 * 6

719,520

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

155 659,21

99 Přesun hmot

41	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	387,533	125,00	48 441,69
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

99 Přesun hmot

48 441,69

HSV Celkem

672 877,44

Celkem

672 877,44

**DOPRAVNÍ STAVBY**
Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ - 28368099 DIČ - CZ28368099

1/2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel: Obec Třebnouševs
Třebnouševs 80
508 01 Hořice
IČ: 00272221
DIČ: CZ00272221

V Třebnouševsi dne: 13. 7. 2015

Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníku v obci Třebnouševs“

V souladu se směrnicí č. 1/2014 obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podání nabídky.

- Předmětem veřejné zakázky na stavební práce „Oprava chodníku v obci Třebnouševs“** je výměna stávajícího živičného povrchu chodníku za betonovou vibrolisovanou dlažbu tvaru I tl. 6 cm barvy šedé a červené. Bude provedena výměna podkladních vrstev, ve vjezdech na pozemky a do garáží zesílená a stabilizovaná cementem, dále výměna silničních obrubníků, v místě vjezdů na pozemky a do garáží snížených. **Místem plnění díla** je obec Třebnouševs. Upravovaná plocha je cca 293 m² na parcele č. 634/2. Příčný sklon chodníku bude 2%. Vybouraný povrch chodníku – asfalt a betonová dlažba bude odvezen – nutno udržovat pořádek. Zadavatel stavby si zajistí vytýčení sítí uložených v chodníku (vyjádření k existenci sítí v příloze). Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro „Oprava chodníku v obci Třebnouševs“ je cca 800.000 Kč s DPH
- Nabídka musí být podána v českém jazyce, doručena v písemné formě osobně na podatelnu úřadu v pracovní dny nebo zaslána doporučeně poštou v uzavřené obálce s nápisem „Neotvírat – oprava chodníku v obci Třebnouševs“ **nejpozději do 28. 7. 2015 do 15:00 hodin** na adresu zadavatele: Obecní úřad Třebnouševs, Třebnouševs 80, 508 01 Hořice. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
- Základním **hodnotícím kritériem** pro zadávání veřejné zakázky je nabídková **cena s DPH**.
Výše nabídkové ceny 100%.
- Nabídka se podává pouze v českém jazyce.
Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
 - Krycí list nabídky – dle závazného vzoru (příloha č. 2)
 - Doklady k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 3)
 - Rozpočet na opravu chodníku v obci Třebnouševs (zpracuje každý uchazeč), (příloha č. 4)
 - Časový harmonogram výstavby (zpracuje pouze vítězný uchazeč)
 - Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č. 5)
- Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:
 - Základní kvalifikační předpoklady stanovené podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
 - Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. Splnění požadavků prokáže zájemce předložením prosté kopie:

- Výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní.
 - Dokladů o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
 - Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná.
- c) Technické kvalifikační předpoklady – seznam a popis minimálně tří obdobných referenčních zakázek v hodnotě 300.000 Kč realizovaných v posledních pěti letech, včetně kontaktů na objednavatele.

Splnění základních, profesních a technických kvalifikačních požadavků prokáže zájemce předložením čestného prohlášení (příloha č. 3).

Pouze vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy o dílo výše uvedené dokumenty v originálním znění nebo v úředně ověřené kopii.

7. Kontaktní osoba zadavatele: Pavel Zajíc
mob.: 724 386 808
e-mail: outrebouseves@cbox.cz
8. Dodavatel stavby zajistí během stavby stanovení dopravního značení odsouhlasené DI Policie ČR (DIO). Podrobné údaje k veřejné zakázce a pro zpracování nabídky jsou uvedena ve výzvě a přiloženém návrhu smlouvy o dílo.
9. **Termín realizace:** září, říjen, listopad, prosinec 2015, předpokládaná doba realizace max. 90 dnů, nejdéle do 31. 12. 2015.
10. Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha, fakturace po dokončení a předání, splatnost faktur 25 dní.
11. Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 500 Kč a to za každý den prodlení.
12. Prohlídku místa plnění lze dohodnout telefonicky na 724 386 808 Pavel Zajíc, nebo 724 184 219 Jaroslav Dušek.
13. Stránky zadavatele: <http://www.trebouseves.cz/index.php?oid=3758029>

S pozdravem,

OBEC TŘEBNOUŠEVES
508 01 Hořice

.....
podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

OBEČNÍ ÚŘAD
TŘEBNOUŠEVES
508 01 Hořice

OBEČNÍ ÚŘAD
TŘEBNOUŠEVES
508 01 Hořice

OBEČNÍ ÚŘAD
TŘEBNOUŠEVES
508 01 Hořice

UVYVĚČENO: 13. 4. 2015

SEJMUTO: 13. 4. 2015

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE: 13. 4. 2015

HARMONOGRAM PRACÍ :

Oprava chodníku v obci Třebnouševěs

	MĚSÍC	ŘÍJEN								LISTOPAD								PROSINEC			
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52							
	TÝDEN	28. 9. - 4. 10.	5. - 11. 10.	12. - 18. 10.	19. - 25. 10.	26. 10. - 1. 11.	2. - 8. 11.	9. - 15. 11.	16. - 22. 11.	23. - 30. 11.	31. 11. - 6. 12.	7. - 13. 12.	14. - 20. 12.	21. - 27. 12.							
POPIS	FINANČNÍ OBJEM																				
Zemní práce	151 051 Kč																				
Komunikace	242 438 Kč																				
Úpravy povrchu, podlahy, osazení	26 188 Kč																				
Trubní vedení	49 100 Kč																				
Ostatní konstrukce a práce - bourání	155 659 Kč																				
Přesun hmot	48 442 Kč																				
Stavba celkem	672 877 Kč																				
Předpokládaná měsíční fakturace	Kč																				

Harmonogram prací je závislý na počasí, předání staveniště a stavební připravenosti ze strany objednatele

Ve Sběři dne 9.9.2015

IZOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.



 Měnová 438/7

 162 00 Praha 6

 IČ - 28366114, DIČ - CZ28366114

Třebnouševs - chodníky - vjezdy - kótováno v cm

140

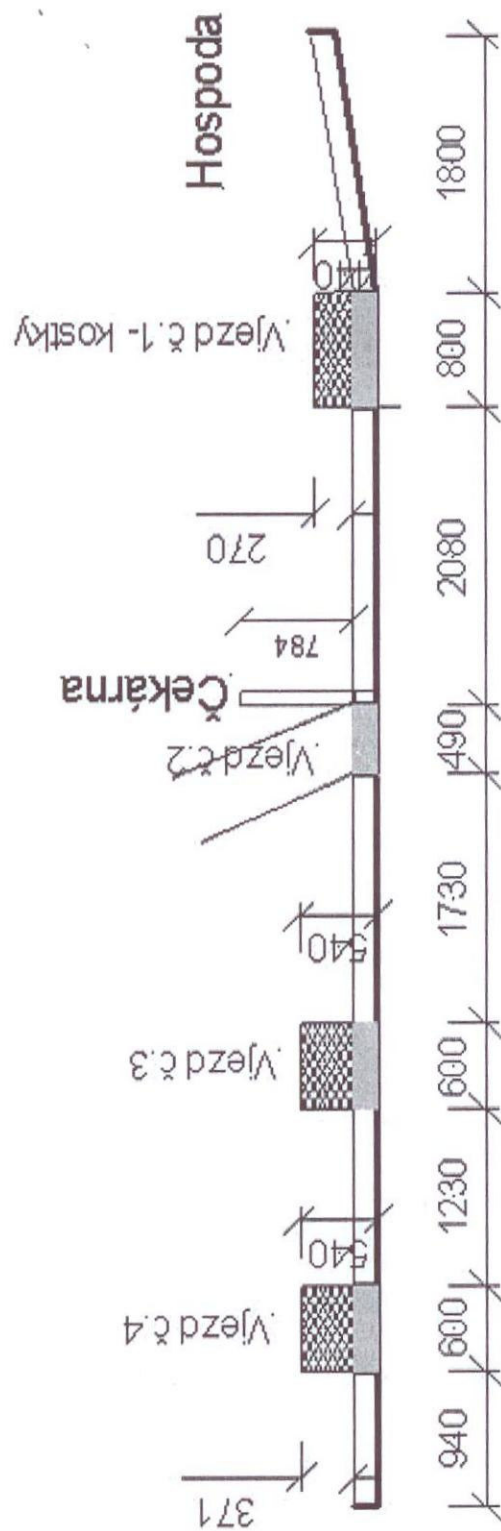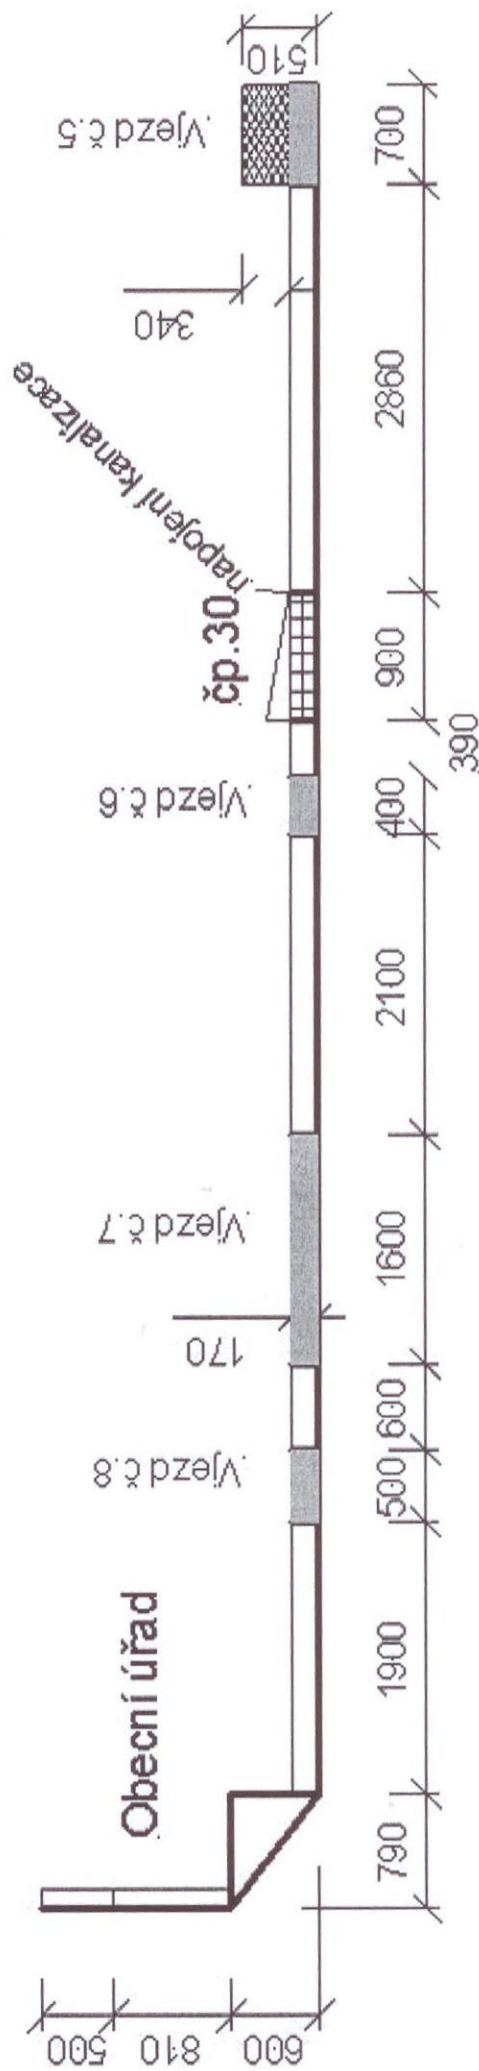

TO
TRADE
DOPRAVA
Křenova 43
162 00 Praha 6
IČ - 26368502 DIČ - CZ26368502
